

ERWEITERUNG VEREINSHEIM

Rückblick 2022



Die Ausgangssituation und unser gemeinsames Ziel



Unsere Ziele: Modernisierung/Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen nachhaltig erfüllen zu können

1. Verbesserung/Optimierung des Raumkonzeptes (letzte Erweiterung vor 30 Jahren | 1991/1992)

- Umkleide- u. Schiedsrichterkabine zu klein
- Das aktuelle Raumkonzept ist sehr schlecht z.B. Dusche zu groß, Umkleidekabinen zu klein

2. Die Modernisierung/Sanierung der Sanitäranlagen, die vorhandenen Anlagen sind zu alt, zu klein und nicht behinderten gerecht

3. Reduzierung Energiebedarf

- Die aktuelle Heizanlage (Nachtspeicherheizung) ist sehr ineffizient → Austausch durch Luftwärmepumpe
- Installation einer Photovoltaikanlage → Reduzierung externen Stromverbrauch (wird aktuell nicht gefördert ggf. im Nachgang durch alternatives Förderprogramm umsetzbar)

ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Unsere Motivation und Inspiration | ein Blick in die Geschichte

Nach der Vereinsgründung war es an der Zeit ... für den Bau des Sportplatzes und die Grundsteinlegung des Vereinshauses aus eigener Kraft



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Zeitstrahl | Was bisher passiert ist

Bauvor- bereitung

- 22.12.2021 Erhalt des positiven Bescheids des Auswahlentscheidung
- 04.01.2022 Einreichung des Förderantrages beim Landratsamt
- 19.01.2022 Abstimmungstermin mit Firma Jan Hess bzgl. der Bauplanung
- 21.04.2022 **Erhalt Bewilligungsbescheid vom Landratsamt**
- 04.06.2022 **Unterschrift Darlehnsvertrag mit der Sparkasse Leipzig (Filiale Eilenburg)**
- 02.08.2022 Auszahlung Kreditsumme der Sparkasse Leipzig

Baudurchführung

- 04.08.2022 **Beginn der Bauarbeiten** | Aushub für die Bodenplatte des neuen Vereinsraums
- 12.08.2022 Fertigstellung der Vorbereitungsarbeiten für die Bodenplatte des neuen Vereinsraums
- 21.08.2022 Lieferung von 2 Baucontainern durch Steffen Hüttl für unseren Alternativ-Vereinsraum
- 01.09.2022 Fertigstellung der Bodenplatte für den neuen Vereinsraum
- 24.09.2022 Fertigstellung des Rohbaus inklusive Ringanker für unseren neuen Vereinsraum
- 16.10.2022 Fertigstellung der Dachdeckerarbeiten und Installation der Fenster des neuen Vereinsraums sowie Beginn der Entkernungsarbeiten in unserem „alten“ Vereinsraum
- 23.10.2022 Fertigstellung der Arbeiten am Außengiebel und der Stützsäulen für das Vordach sowie Beginn der Innenarbeiten im „alten“ Vereinsraum
- 01.12.2022 Zwischenstand zu den Innenarbeiten | Vorbereitungsarbeiten für die Elektrik im neuen Vereinsraum | Einbau der neuen Eingangstür | Einbau der Fensterbänke im neuen und alten Vereinsraum | Abdichtung der Bodenplatte im neuen Vereinsraum | Anbringung der Unterkonstruktion der Decke im neuen Vereinsraum | Dämmung der Decke im neuen Vereinsraum | Herstellung der Fenster- und Türöffnungen im alten Vereinsraum
- 11.12.2022 Installation der Module für unsere neue Photovoltaik-Anlage
- 18.12.2022 Fertigstellung des Unterbetons

Aus- blick

- Anfang 2023 wollen wir die Fußbodenheizung in unserem neuen und alten Vereinsraum verlegen damit anschließend der Estrich verlegt werden kann
- Bis zu unserem ersten Heimspiel am 04.03.2023 wollen wir den neuen Vereinsraum, die Heim-, Trainer- und Schiedsrichter-Kabine sowie unsere neue Dusche fertiggestellt haben

ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Baustart am 04.08.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Anlieferung der Container am 19.08.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Fertigstellung der Bodenplatte am 01.09.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Beginn des Rohbaus am 14.09.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Fertigstellung des Ringankers am 19.09.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Aufstellung des Dachstuhls am 11.10.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Installation der Sandwichplatte und Verkleidung des Giebels am 13.10.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Anbringung der Dachdämmung und Verkleidung des Giebels am 10.11.2022 bzw. 11.11.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Installation der Module für die Photovoltaik-Anlage am 07.12.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Abrissarbeiten und Vorbereitung für den Trockenbau am 10.12.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Rückblick 2022 im Bildern | Fertigstellung des Unterbetons am 18.12.2022



ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Ausblick 2023



ERWEITERUNG VEREINSHEIM




Ausblick | Bis zu unserem ersten Heimspiel am **04.03.2023** wollen wir den neuen Vereinsraum, die Heim-, Trainer- und Schiedsrichter-Kabine sowie unsere neue Dusche fertiggestellt haben

Ausstehende Arbeiten

- Innenputz für Heim-, Trainer- und Schiedsrichter-Kabine
- Installation der Fußbodenheizung
- Ab dem 23.01.2023 ist der Beginn der Verlegung des Estrichs geplant
- Ende Januar ist die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage geplant
- Fliesen der Dusche
- Fertigstellung der Elektrik-Installation
- Einbringung der Fußbodenbeläge und Installation der Küche ist für Ende Februar geplant




Fertigstellung 2 von 3 Bauabschnitten

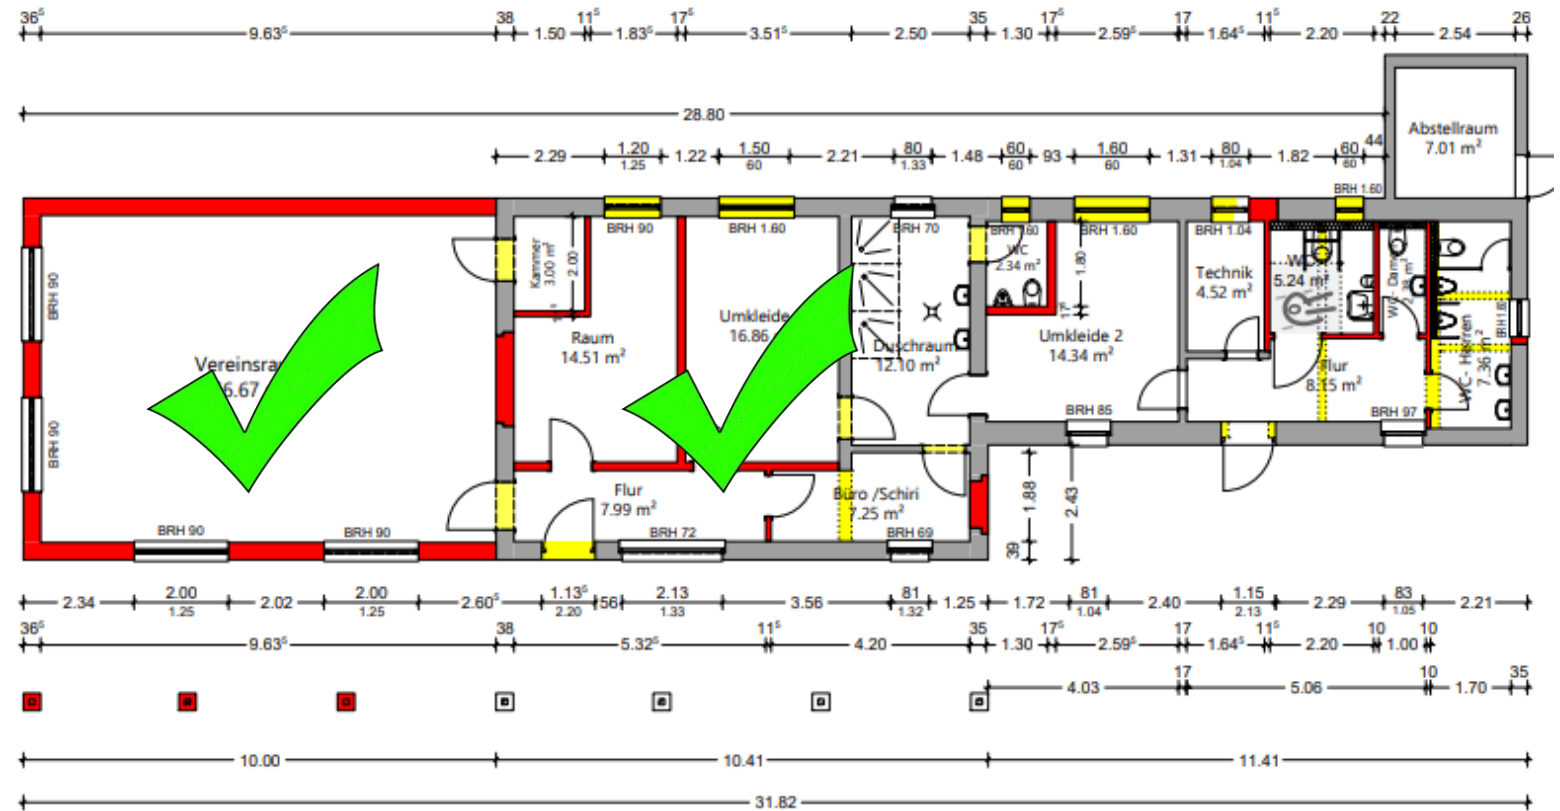

ERWEITERUNG VEREINSHEIM



Das Ziel weiterhin fest vor Augen



ERWEITERUNG VEREINSHEIM





ERWEITERUNG VEREINSHEIM

Danke für Eure bisherige Unterstützung, ohne diese hätten wir das bereits Erreichte nicht geschafft.

Wir hoffen auch in 2023 weiter auf Eure Unterstützung zählen zu können.

Ein großes Stück des Weges ist bereits gegangen, lasst uns die restlichen Schritte gemeinsam bewältigen – gemeinsam schaffen wir das



AUS ALT MACH NEU Vereinsheim SV Naundorf e.V.



Mehr als 30 Jahre ist nun die letzte Sanierung her. Dank einer Förderung durch das Programm „LEADER“ bekommen wir jetzt die Möglichkeit unser Vereinsheim am Waldsportpark in einem neuen Glanz erstrahlen zu lassen.

Die Kosten der **Sanierung und Erweiterung** betragen ca. 300.000 Euro. Der SV Naundorf e. V. muss dazu einen Eigenanteil in Höhe von 30.000 Euro aufbringen.

Mit deiner Spende kannst du einen wichtigen Beitrag leisten und uns dabei unterstützen.

Bitte überweise deine Spende auf folgendes Bankkonto:

Kontoinhaber	SV Naundorf e.V.
IBAN	DE06 8605 5592 2230 0323 32
BIC	WELADE8LXXX (Sparkasse Leipzig)
Verwendungszweck	Unterstützung SV Naundorf, Name und Anschrift

Jeder Euro zählt, um dem Traum eines neuen Vereinsheims ein Stück näher zu kommen.



Für Spenden über 300,00€ stellen wir dir selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus. Bis zu einer Höhe von 300,00€ ist als Spendennachweis gegenüber dem Finanzamt der Einzahlungsbeleg bzw. der Kontoauszug ausreichend.



www.sv-naundorf.de | Michael Winkler-Reichert | 0151 44 33 54 49 | michael.winkler@sv-naundorf.de

